

INFORME DE CIERRE · PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Conecta +

Plataforma de gestión de donaciones de alimentos y recursos entre empresas y organizaciones sociales

Proyecto final de la materia: Ingeniería de Software

Alumno: Evan David Morales Serrano

Matrícula: AL03086130

Profesor: Santos Guadalupe Facio Barraza

Fases: Implementación y seguridad · Pruebas y calidad · Cierre y evaluación

Repositorio: <https://github.com/EvanDavidMS/conecta-mas-donaciones>

Fecha: 28 de septiembre de 2026

Contenido

1. Resumen ejecutivo.....	3
2. Alcance y solución implementada	3
2.1 Roles del sistema	3
2.2 Ruta guiada por rol	3
2.3 Flujo de una donación.....	4
2.4 Arquitectura y decisiones técnicas	4
3. Comparación entre lo planificado y lo ejecutado	7
3.1 Alcance planificado frente al entregado	8
3.2 Incidentes que afectaron el cronograma	8
4. Resultados de pruebas y calidad.....	9
4.1 Pruebas unitarias y de integración (Jest + Supertest).....	9
4.2 Pruebas de seguridad (OWASP ZAP).....	10
4.3 Análisis de calidad del código (SonarQube).....	11
5. Lecciones aprendidas	12
5.1 Durante la planificación	12
5.2 Durante la implementación	13
6. Plan de mejora continua	13
6.1 Propuestas de innovación.....	14
6.2 Seguimiento	14
7. Conclusiones	14

1. Resumen ejecutivo

Conecta + es un sistema web que conecta a empresas o personas que tienen excedentes de alimentos y recursos (donadores) con organizaciones sociales que los necesitan (beneficiarias). Un equipo administrador verifica a las organizaciones, asigna cada donación y da trazabilidad a todo el proceso.

El proyecto se completó en sus tres fases. Se entregó un sistema funcional con autenticación JWT y tres roles, un pipeline CI/CD que prueba, analiza, construye y despliega automáticamente en un entorno de prueba, y un ciclo completo de pruebas de seguridad y calidad con identificación y corrección de hallazgos.

Indicador	Meta	Resultado
Pruebas automatizadas	—	131 pruebas en 7 suites, 0 fallos
Cobertura de pruebas unitarias	≥ 80 %	99.84 % líneas · 96.89 % ramas · 99.34 % funciones
Etapas del pipeline CI/CD	Pruebas, build y despliegue	5 etapas: pruebas, SonarQube, build Docker, staging + smoke + ZAP, publicación
Vulnerabilidades OWASP ZAP (Alto/Medio)	0	0 / 0
Quality Gate SonarQube	Aprobado	Aprobado · Seguridad A · Fiabilidad A · Mantenibilidad A
Esfuerzo	9 h planificadas	12 h ejecutadas (+33 %)

2. Alcance y solución implementada

2.1 Roles del sistema

Rol	Responsabilidades
Donador	Publica donaciones (la fecha de caducidad es obligatoria para alimentos), consulta su estado, cancela las que siguen disponibles y ve su impacto: kilos entregados y organizaciones apoyadas.
Beneficiario	Se registra como organización (queda pendiente de verificación), explora y filtra el catálogo, solicita donaciones, cancela solicitudes pendientes y confirma la recepción.
Administrador	Verifica, suspende o reactiva cuentas; aprueba, rechaza o revoca solicitudes; registra entregas; consulta métricas globales y la auditoría. No puede crearse desde el registro público.

2.2 Ruta guiada por rol

Cada rol tiene una ruta guiada que recorre sus paneles, resalta cada elemento y explica para qué sirve: 10 pasos para el donador, 10 para el beneficiario y 11 para el administrador. Arranca sola la primera vez que el usuario entra, se puede repetir con el botón «Ruta guiada» de la barra superior y funciona en escritorio, en móvil y con el teclado.

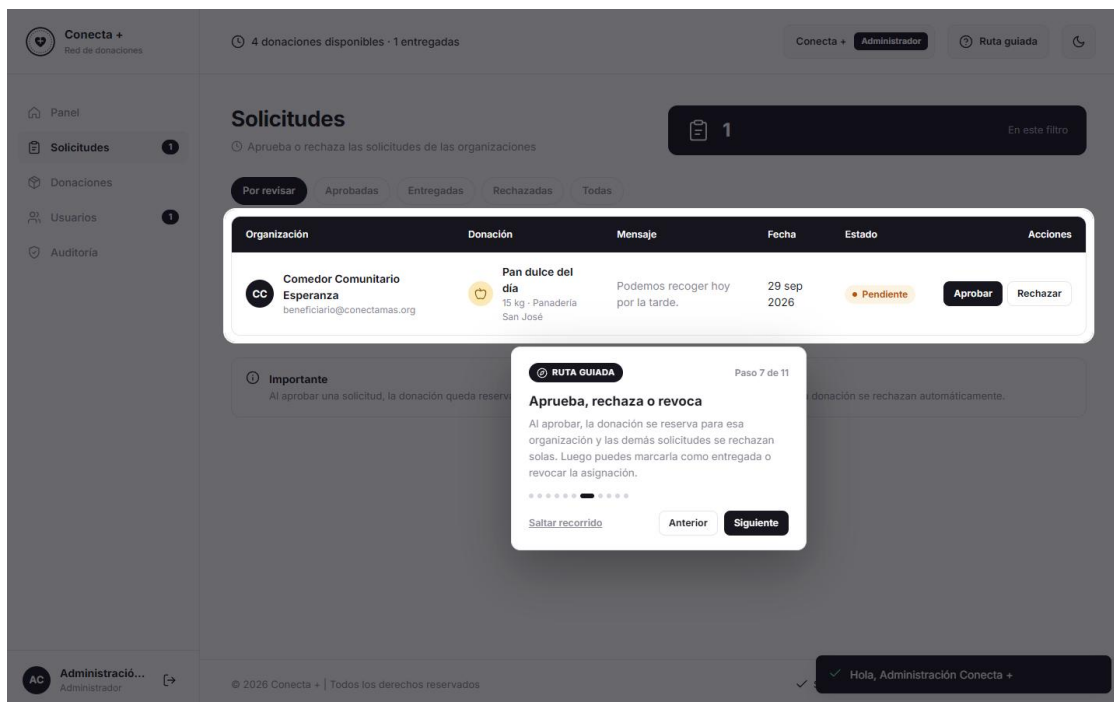


Figura 1. Ruta guiada del administrador: paso sobre el panel de solicitudes.

2.3 Flujo de una donación

Disponible → (una organización verificada la solicita) → el administrador aprueba y la donación queda Reservada; las demás solicitudes se rechazan automáticamente → la organización confirma la recepción y la donación queda Entregada. Si la fecha de caducidad llega sin asignación, la donación pasa a Vencida.

2.4 Arquitectura y decisiones técnicas

- **Backend:** Node.js 20 + Express, organizado en rutas, middleware y servicios de dominio.
- **Almacenamiento:** en el propio servidor (memoria + archivo JSON con escritura atómica). No requiere base de datos ni servicios de pago, como pidió el cliente.
- **Frontend:** HTML, CSS y JavaScript sin frameworks, basado en el diseño de referencia (monocromático, barra lateral, paneles oscuros de métricas), responsive y con modo oscuro.
- **Entrega:** imagen Docker multi-stage con usuario sin privilegios y healthcheck.

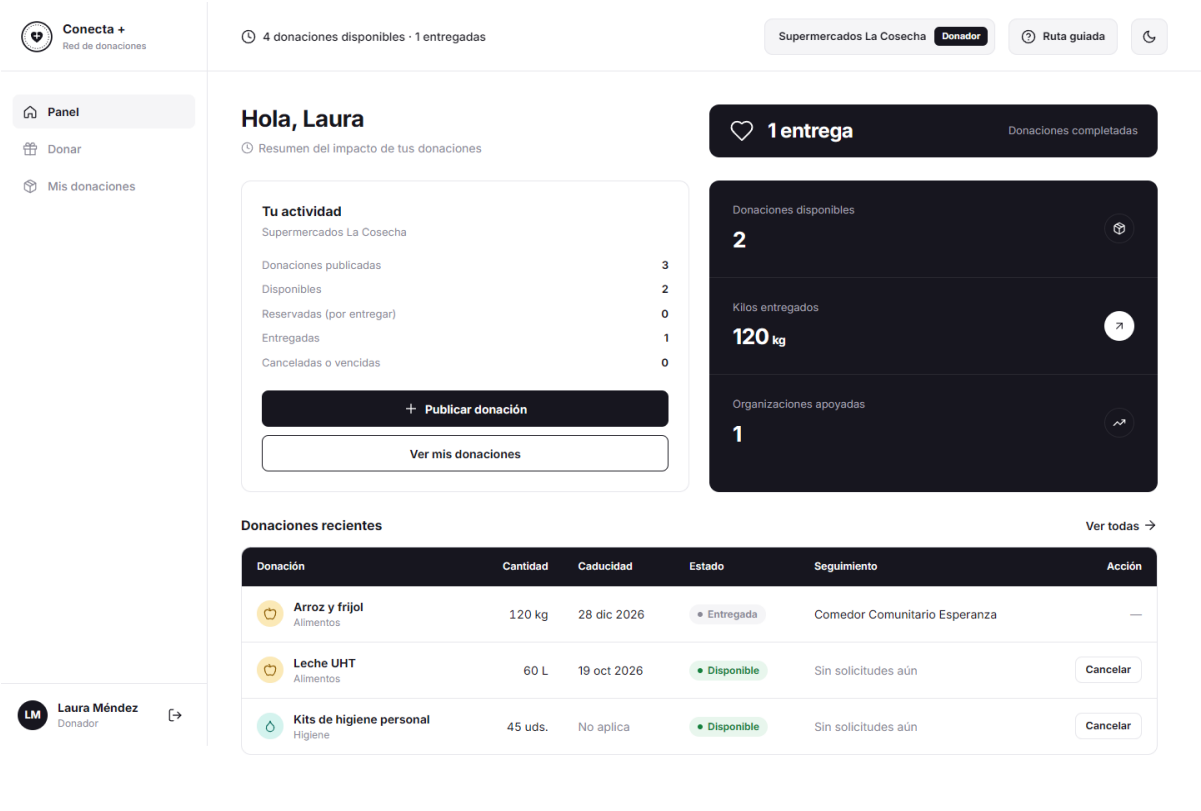


Figura 2. Panel del donador (escritorio).

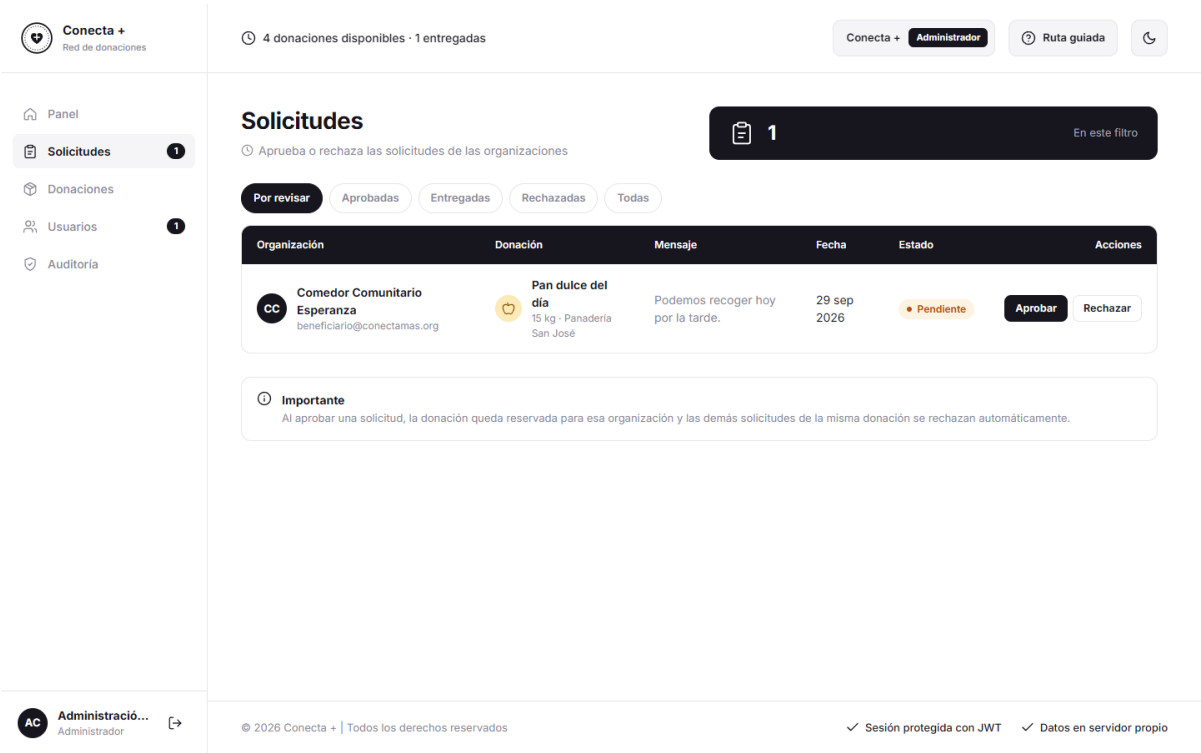


Figura 3. Revisión de solicitudes por el administrador.

3. Comparación entre lo planificado y lo ejecutado

La tabla compara las horas planificadas por fase, según la guía de la actividad (4 h, 3 h y 2 h), con el esfuerzo real registrado para cada tarea y la causa de cada desviación.

Fase	Tarea	Plan	Real	Desviación y causa
1. Implementación y seguridad	Arquitectura y modelo de datos en servidor (sin BD)	0.5 h	0.5 h	Sin desviación.
	Registro y autenticación JWT con roles	1 h	1.25 h	Se añadieron revocación de tokens en servidor y bloqueo por intentos fallidos (no planificados).
	Módulos de donaciones, solicitudes y administración	1 h	1.5 h	El alcance pasó de 2 roles (admin/usuario) a 3 roles con verificación de organizaciones y máquina de estados.
	Interfaz UI/UX responsive	0.5 h	1.25 h	Adaptación del diseño de referencia, tablas convertibles a tarjetas en móvil y modo oscuro.
	Cambio solicitado: nombre «Conecta +» y ruta guiada por rol	0 h	1 h	No estaba en el plan: lo pidió el cliente al revisar la primera versión. Incluyó el motor del recorrido, 31 pasos en total y pruebas en escritorio y móvil.
	Pruebas unitarias ($\geq 80\%$)	0.5 h	0.75 h	Se alcanzó 99.84 % de líneas con 131 pruebas.
	Pipeline CI/CD (GitHub Actions)	0.5 h	1 h	La primera ejecución falló en el job de SonarQube (permisos y directorio de trabajo del scanner).
2. Pruebas y calidad	Escaneo OWASP ZAP (baseline + API activo autenticado)	1.5 h	1.25 h	Menor al plan: el escaneo se automatizó en un script reutilizable en local y en CI.
	Corrección de hallazgos de ZAP	0.5 h	0.25 h	Solo hubo 1 alerta Baja y avisos informativos.
	Análisis SonarQube y métricas	0.5 h	0.75 h	Rutas de lcof con “\” generadas en Windows y arranque lento de SonarQube (≈ 5 min).
	Corrección de hallazgos de SonarQube	0.5 h	0.5 h	Credencial por defecto en el código y 8 code smells.
3. Cierre y evaluación	Informe de cierre y lecciones aprendidas	1.25 h	1.25 h	Sin desviación.
	Plan de mejora continua	0.75 h	0.75 h	Sin desviación.

Fase	Planificado	Ejecutado	Variación
1. Implementación y seguridad	4 h	7.25 h	+81 %
2. Pruebas y calidad	3 h	2.75 h	-8 %
3. Cierre y evaluación	2 h	2 h	0 %
Total	9 h	12 h	+33 %

3.1 Alcance planificado frente al entregado

Requisito	Planificado	Ejecutado
Usabilidad	No contemplada	Ruta guiada por rol en todos los paneles (cambio solicitado por el cliente)
Módulo básico	Registro de donantes	Registro de donadores y organizaciones, además de donaciones, solicitudes, verificación, entregas, métricas y auditoría
Autenticación y roles	JWT con roles administrador/usuario	JWT HS256 con 3 roles, cookie httpOnly, revocación en servidor y bloqueo por intentos fallidos
Pruebas unitarias	Cobertura ≥ 80 % con Jest	131 pruebas; 99.84 % de líneas y 96.89 % de ramas; umbral del 80 % forzado en CI
CI/CD	Despliegue automático en un entorno de prueba	GitHub Actions: pruebas $\rightarrow$ SonarQube $\rightarrow$ build Docker $\rightarrow$ staging + smoke test + ZAP $\rightarrow$ publicación en GHCR
Seguridad	Escaneo OWASP ZAP (XSS, SQLi)	ZAP baseline con spider AJAX y escaneo activo autenticado de toda la API, dentro del pipeline
Calidad	SonarQube con métricas documentadas	SonarQube Community (contenedor efímero) con reporte automático antes y después de las correcciones
Despliegue	Entorno de prueba	Staging efímero en el runner con Docker (sin costo). No se usaron servicios de pago

3.2 Incidentes que afectaron el cronograma


- **Límite de peticiones en las pruebas E2E:** el limitador anti fuerza bruta (20 intentos cada 15 min) bloqueó las pruebas automatizadas del navegador. Se resolvió con límites configurables por entorno. Además confirmó que el control funciona.
- **Diferencias entre Windows y Linux:** el archivo lcov generado en Windows usa “\” y SonarQube (Linux) no lo reconocía. Se normalizaron las rutas en el script de análisis.
- **Fallo del job de SonarQube en la primera ejecución del pipeline:** el scanner escribía su reporte en /tmp del contenedor y con otro UID. Se corrigió fijando sonar.working.directory, el usuario del contenedor y fetch-depth: 0 para el blame de git.
- **Revocación del token durante el escaneo:** el escaneo activo de ZAP llamaba a /logout, lo que invalidaba el JWT del propio escaneo. Se excluyó esa ruta del análisis.
- **Cambio de alcance a mitad del cierre:** tras revisar la primera versión, el cliente pidió renombrar el proyecto a «Conecta +» y añadir una ruta guiada. Se renombraron código, documentación, repositorio y la imagen Docker, y se repitieron los análisis de calidad y seguridad.
- **Entorno:** Docker Desktop estaba apagado y la CLI de GitHub no estaba instalada. Se arrancó el servicio y el repositorio se creó mediante la API REST de GitHub.

4. Resultados de pruebas y calidad

4.1 Pruebas unitarias y de integración (Jest + Supertest)

Métrica	Cubierto / total	%
Sentencias	713 / 714	99.85 %
Ramas	312 / 322	96.89 %
Funciones	152 / 153	99.34 %
Líneas	626 / 627	99.84 %

Las pruebas cubren autenticación (tokens manipulados, alg=none, expirados, revocados), autorización por rol y por propietario (IDOR), validación de entradas (XSS, inyección, asignación masiva, escalada de rol), reglas de negocio completas y protecciones HTTP (CSP, CSRF, rate limiting, tamaño de petición y errores sin trazas). Se complementan con una prueba de humo de 17 verificaciones en staging y un recorrido E2E en navegador por los tres roles.

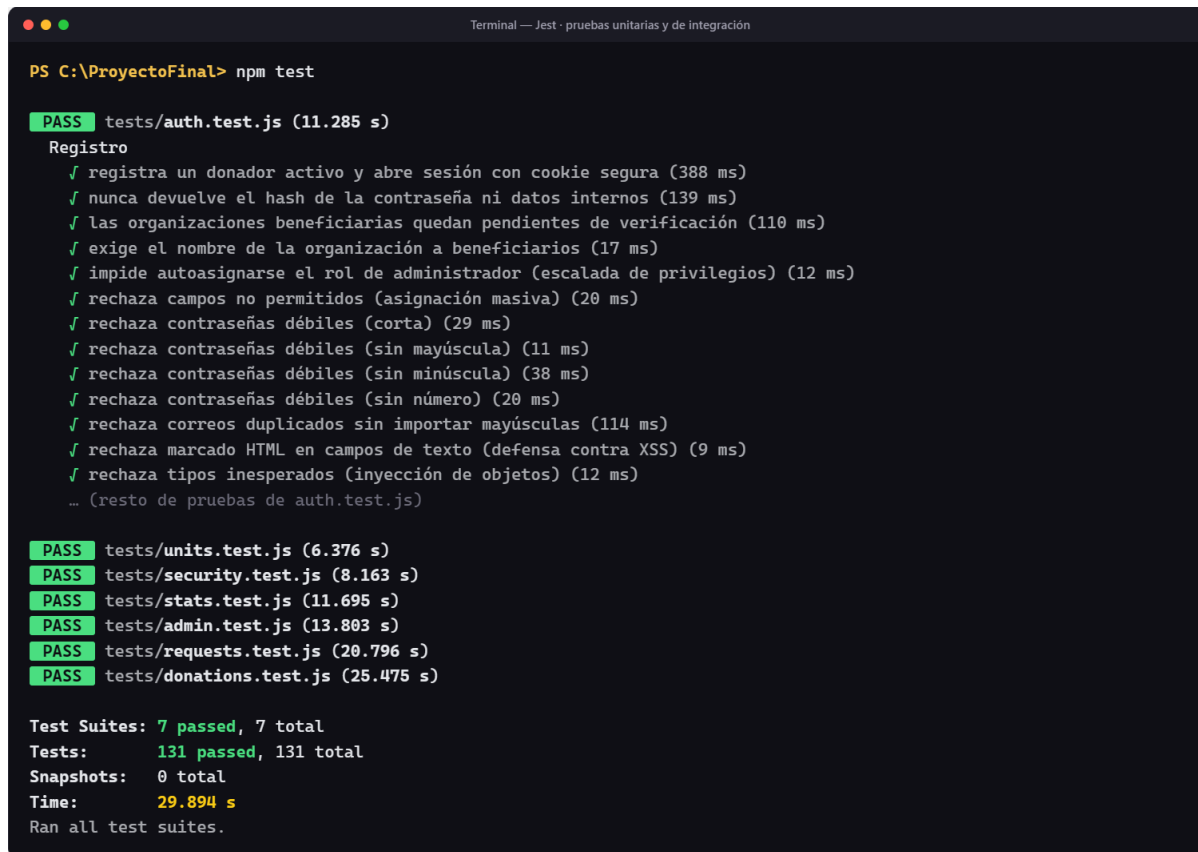

```

PS C:\ProyectoFinal> npm test

PASS tests/auth.test.js (11.285 s)
  Registro
    ✓ registra un donador activo y abre sesión con cookie segura (388 ms)
    ✓ nunca devuelve el hash de la contraseña ni datos internos (139 ms)
    ✓ las organizaciones beneficiarias quedan pendientes de verificación (110 ms)
    ✓ exige el nombre de la organización a beneficiarios (17 ms)
    ✓ impide autoasignarse el rol de administrador (escalada de privilegios) (12 ms)
    ✓ rechaza campos no permitidos (asignación masiva) (20 ms)
    ✓ rechaza contraseñas débiles (corta) (29 ms)
    ✓ rechaza contraseñas débiles (sin mayúscula) (11 ms)
    ✓ rechaza contraseñas débiles (sin minúscula) (38 ms)
    ✓ rechaza contraseñas débiles (sin número) (20 ms)
    ✓ rechaza correos duplicados sin importar mayúsculas (114 ms)
    ✓ rechaza marcado HTML en campos de texto (defensa contra XSS) (9 ms)
    ✓ rechaza tipos inesperados (inyección de objetos) (12 ms)
    ... (resto de pruebas de auth.test.js)

PASS tests/units.test.js (6.376 s)
PASS tests/security.test.js (8.163 s)
PASS tests/stats.test.js (11.695 s)
PASS tests/admin.test.js (13.803 s)
PASS tests/requests.test.js (20.796 s)
PASS tests/donations.test.js (25.475 s)

Test Suites: 7 passed, 7 total
Tests:       131 passed, 131 total
Snapshots:   0 total
Time:        29.894 s
Ran all test suites.
  
```

Figura 4. Evidencia real: salida de Jest con los 7 archivos de prueba en PASS y 131 pruebas aprobadas.

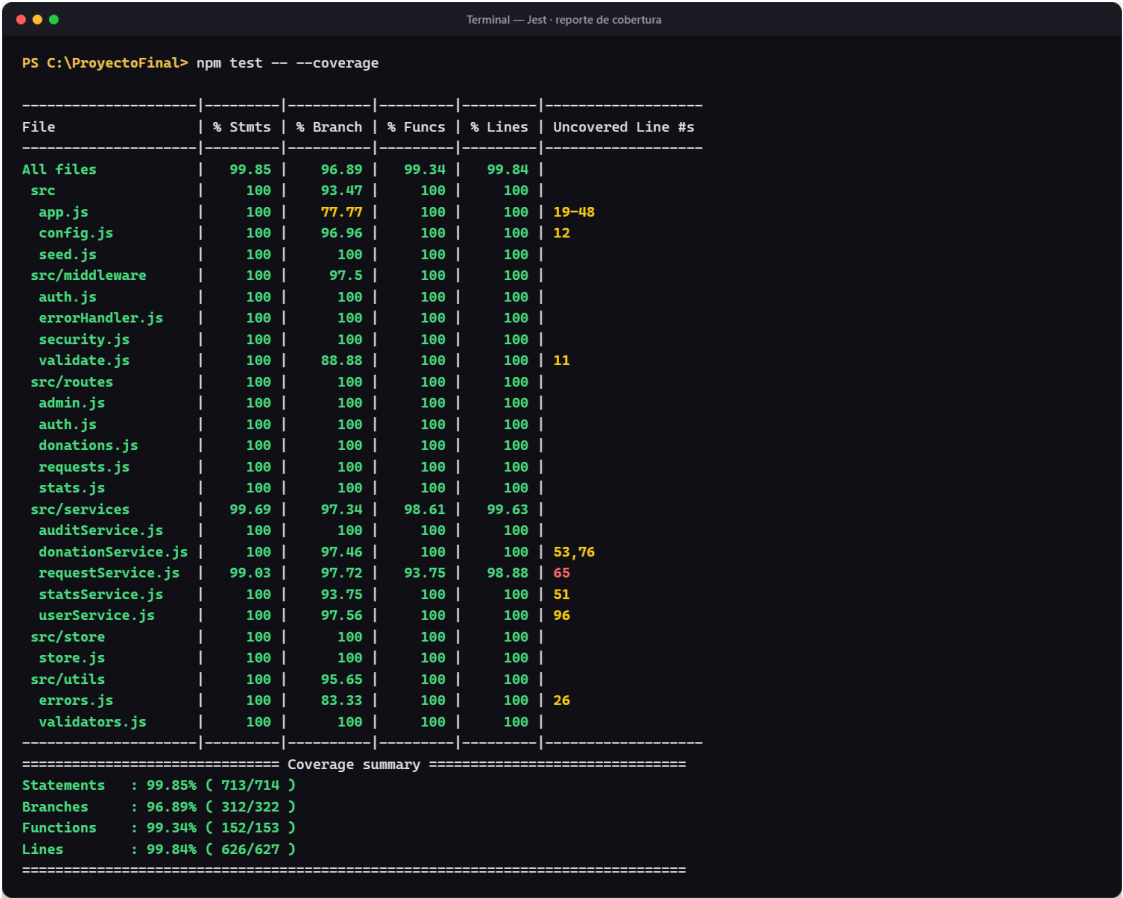


Figura 5. Evidencia real: reporte de cobertura de Jest por archivo (99.84 % de líneas).

4.2 Pruebas de seguridad (OWASP ZAP)

Se ejecutaron dos escaneos contra el contenedor desplegado: un baseline (spider tradicional y AJAX con análisis pasivo) y un escaneo activo autenticado con JWT de administrador sobre todos los endpoints de la especificación OpenAPI, que incluye reglas de SQL Injection (genérica y time-based para MySQL, PostgreSQL, Oracle y MsSQL), XSS reflejado, persistente y DOM, inyección de comandos, SSTI, path traversal y CRLF.

Riesgo	Escaneo inicial	Tras las correcciones
Alto	0	0
Medio	0	0
Bajo	1	1
Informativo	8	8

Hallazgo	Riesgo	Acción
Unexpected Content-Type (rutas fuera de /api respondían HTML a métodos PATCH, p. ej. sondeos de metadatos cloud)	Bajo	Corregido: fuera de la API solo se admiten GET/HEAD (405 JSON) y los clientes JSON reciben 404 en JSON. Quedan la raíz "/" (la aplicación HTML) y la página 404 para navegadores, comportamiento esperado.

Hallazgo	Riesgo	Acción
Information Disclosure – Suspicious Comments (dom.js)	Informativo	Corregido: el comentario contenía “Todo...”, que ZAP interpreta como TODO.
Non-Storable / Non-Cacheable Content	Informativo	Intencional: la API responde con Cache-Control: no-store porque maneja datos personales.
Information in Browser localStorage	Informativo	Aceptado: solo se guardan la preferencia de tema y si ya se vio la ruta guiada. El token vive en una cookie httpOnly.
Authentication Request Identified / Client Error responses / Modern Web App	Informativo	Esperado: identificación del login y respuestas 4xx de validación.

4.3 Análisis de calidad del código (SonarQube)

Métrica	Análisis inicial	Tras las correcciones
Quality Gate	Aprobado	Aprobado
Líneas de código	4031	4441
Bugs	0	0
Vulnerabilidades	1	0
Security hotspots	0	0
Code smells	8	0
Deuda técnica	0 h 40 min	0 h 0 min
Ratio de deuda técnica	0.0 %	0.0 %
Calificación de mantenibilidad	A	A
Calificación de fiabilidad	A	A
Calificación de seguridad	C	A
Cobertura	98.4 %	98.4 %
Duplicación	0.0 %	0.0 %
Complejidad cognitiva	371	406

Correcciones aplicadas: (1) la vulnerabilidad S2068 se resolvió sacando las credenciales de demostración del código a un archivo de configuración (demo.env) y generando contraseñas aleatorias cuando no se definen; en producción siguen siendo obligatorias; (2) se eliminaron los operadores ternarios anidados (S3358); (3) se movió una función asíncrona al ámbito externo (S7721); (4) se usó encadenamiento opcional (S6582); (5) se reemplazó role="status" por el elemento <output> por accesibilidad (S6819).

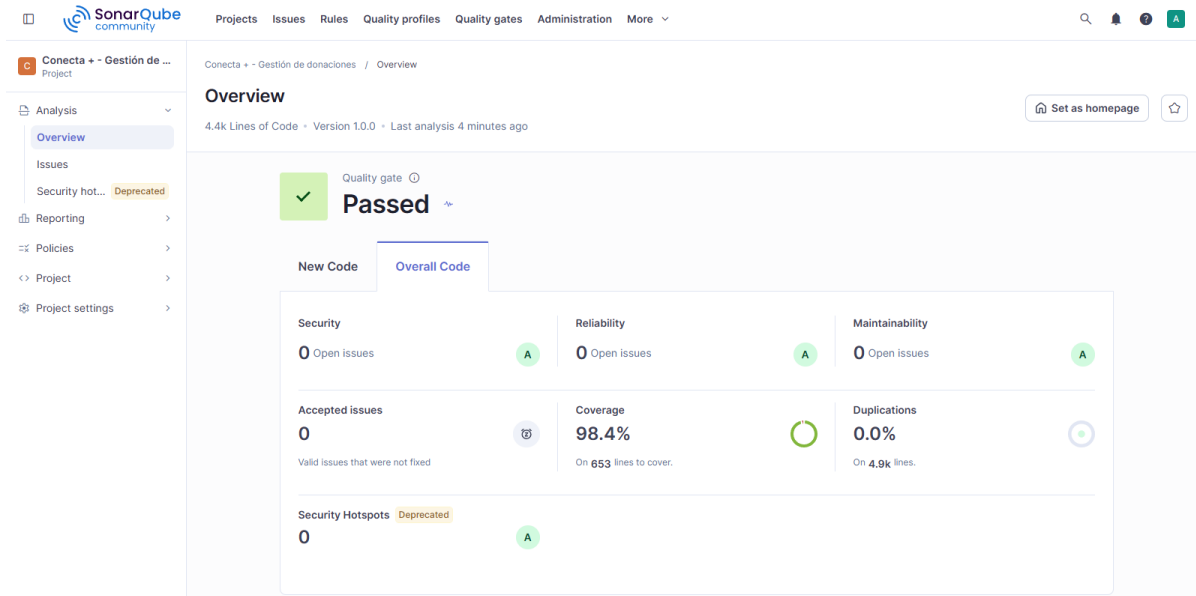


Figura 6. Evidencia real: tablero de SonarQube con Quality Gate aprobado y calificación A en seguridad, fiabilidad y mantenibilidad.

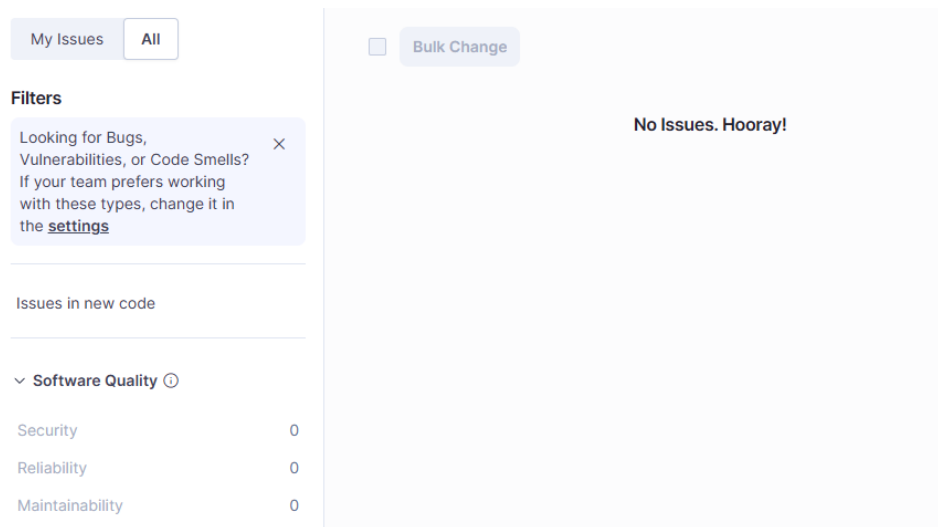


Figura 7. Evidencia real: lista de incidencias de SonarQube vacía («No Issues»).

Nota: la edición gratuita de SonarQube no analiza vulnerabilidades de inyección (SQL, XSS); por eso esas pruebas se cubrieron con OWASP ZAP (sección 4.2).

5. Lecciones aprendidas

5.1 Durante la planificación

1. **Definir roles y estados antes de programar ahorra retrabajo.** Modelar primero la máquina de estados (disponible, reservada, entregada, vencida) permitió implementar y probar las reglas de negocio sin cambios de diseño posteriores.
2. **El alcance crece si no se acota.** Pasar de 2 a 3 roles aumentó un 50 % el esfuerzo del módulo. Conviene estimar con margen y priorizar lo que pide la rúbrica antes de añadir extras.

3. **Las restricciones del cliente definen la arquitectura.** No usar bases de datos ni servicios de pago llevó a un almacenamiento en servidor con persistencia en JSON. Es simple y sin costo, pero limita la escalabilidad y se registró como deuda técnica.
4. **Validar la usabilidad con el cliente desde el inicio.** La ruta guiada surgió en la revisión final. Una revisión temprana con el cliente habría permitido planificarla desde el principio.
5. **La interfaz no estaba estimada.** La UI/UX consumió 2.5 veces lo previsto. En el siguiente ciclo se estimará como una tarea propia.

5.2 Durante la implementación

6. **La seguridad desde el diseño reduce los hallazgos.** La validación estricta (listas blancas, sin campos desconocidos) y el frontend sin innerHTML hicieron que ZAP no encontrara vulnerabilidades de riesgo Medio o Alto.
7. **Separar la configuración del código desde el primer día.** SonarQube marcó como vulnerabilidad una contraseña de demostración escrita en el código. El problema no era el valor, sino dónde estaba.
8. **Los controles de seguridad afectan a las pruebas.** El limitador de peticiones bloqueó las pruebas E2E. Los parámetros de seguridad deben ser configurables por entorno y documentarse.
9. **Probar el pipeline pronto y en el sistema operativo real del runner.** Las diferencias entre Windows y Linux (rutas, permisos, UID) solo aparecieron en CI. Ejecutar los mismos scripts en local y en CI redujo esa brecha.
10. **Automatizar las herramientas de calidad como scripts versionados.** Tener sonar-scan.sh y zap-scan.sh en el repositorio permitió repetir los análisis antes y después de las correcciones y comparar métricas objetivamente.
11. **La cobertura no mide todo.** El frontend está fuera de la cobertura de Jest. Las pruebas E2E en navegador encontraron detalles de UX (plurales, alineación) que las pruebas unitarias no detectan.

6. Plan de mejora continua

El plan sigue el ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), con una revisión mensual de los indicadores a partir de las métricas del pipeline, de SonarQube y del registro de auditoría del sistema.

#	Acción	Indicador (KPI)	Meta	Plazo
1	Automatizar pruebas E2E del frontend con Playwright en el pipeline	Flujos críticos cubiertos (8 identificados)	100 % de los flujos; 0 regresiones en producción	1 mes
2	Endurecer el Quality Gate	Calificación de seguridad en SonarQube; umbral de ZAP	Seguridad A; fallar el pipeline ante alertas de riesgo Medio	2 semanas
3	Notificaciones por correo al aprobar, rechazar o asignar	Tiempo medio entre solicitud y decisión (auditoría)	< 24 h	1 mes
4	Reducir donaciones vencidas con alertas de caducidad próxima	Porcentaje de donaciones vencidas sin asignar	< 5 % mensual	2 meses
5	Migrar el almacenamiento a SQLite o PostgreSQL al superar el umbral de carga	Donaciones por mes; latencia p95	Migrar al superar 1 000 donaciones/mes; p95 < 300 ms	Según demanda

#	Acción	Indicador (KPI)	Meta	Plazo
6	Observabilidad: logs estructurados y monitoreo de disponibilidad	Disponibilidad mensual; tiempo de detección de incidentes	≥ 99.5 %; < 5 min	2 meses
7	Auditoría de accesibilidad WCAG 2.1 AA	Puntuación de accesibilidad en Lighthouse	≥ 95 en todas las vistas	1 mes

6.1 Propuestas de innovación

- **IA para predecir donaciones futuras.** Entrenar un modelo de series temporales (por ejemplo, Prophet o regresión con estacionalidad) con el historial de donaciones por categoría, zona y temporada para anticipar la oferta y alertar a las organizaciones de escasez. KPI: error porcentual absoluto medio (MAPE) < 20 % a 4 semanas.
- **Emparejamiento inteligente donación–organización.** Un recomendador que sugiera al administrador la organización más adecuada según cercanía, categoría, capacidad declarada e historial de entregas. KPI: reducir un 30 % el tiempo de asignación y un 50 % las donaciones vencidas.
- **Optimización de rutas de recolección.** Agrupar donaciones cercanas para que una organización recoja varias en un solo recorrido. KPI: kilómetros por kilo entregado.
- **Confirmación de entrega con código QR y aplicación instalable (PWA).** Mejora la trazabilidad y permite operar con conectividad limitada. KPI: 100 % de las entregas confirmadas con evidencia.

6.2 Seguimiento

Cada acción tiene responsable, indicador y fecha de revisión. Los indicadores técnicos (cobertura, calificaciones de SonarQube y alertas de ZAP) se revisan automáticamente en cada ejecución del pipeline. Los de negocio (tiempos de asignación, vencidas y kilos entregados) salen de las métricas y de la auditoría del sistema. Las acciones que no alcancen su meta en dos revisiones consecutivas se replanifican en el siguiente ciclo PDCA.

7. Conclusiones

El proyecto cumplió los objetivos de las tres fases. El sistema es funcional, tiene autenticación y autorización robustas, 131 pruebas automatizadas con 99.84 % de cobertura y un pipeline CI/CD que despliega automáticamente en un entorno de prueba y bloquea cualquier cambio que no pase las pruebas, el análisis de calidad o el escaneo de seguridad. El esfuerzo superó el plan en +33 % por la ampliación del alcance a tres roles, la interfaz y la ruta guiada solicitada por el cliente, pero esa inversión dio como resultado un producto más completo y seguro. El plan de mejora continua define los siguientes pasos con metas medibles, incluida la incorporación de inteligencia artificial para predecir donaciones.
